Département d'Ille-et-Vilaine. Arrondissement de Rennes. Commune de Romazy. Mémooire des travaux de Construction de la Maison d'école de Romazy, faitq par Coirre, entrepreneur, sous la direction de M. Nugue architecte.

Numéro d'inventaire : 1979.12447
Auteur(s) : Coirre
Type de document : manuscrit, tapuscrit
Période de création : 3e quart 19e siècle
Date de création : 1850
Description : Feuilles doubles cousues, manuscrites, couverture papier fort.
Mesures : hauteur : 285 mm ; largeur : 189 mm
Mots-clés : Bâtiments scolaires : Écoles primaires
Filière : École primaire élémentaire
Niveau : Élémentaire
Nom de la commune : Romazy
Nom du département : Ille-et-Vilaine
Autres descriptions : Langue : Français
Nombre de pages : 23

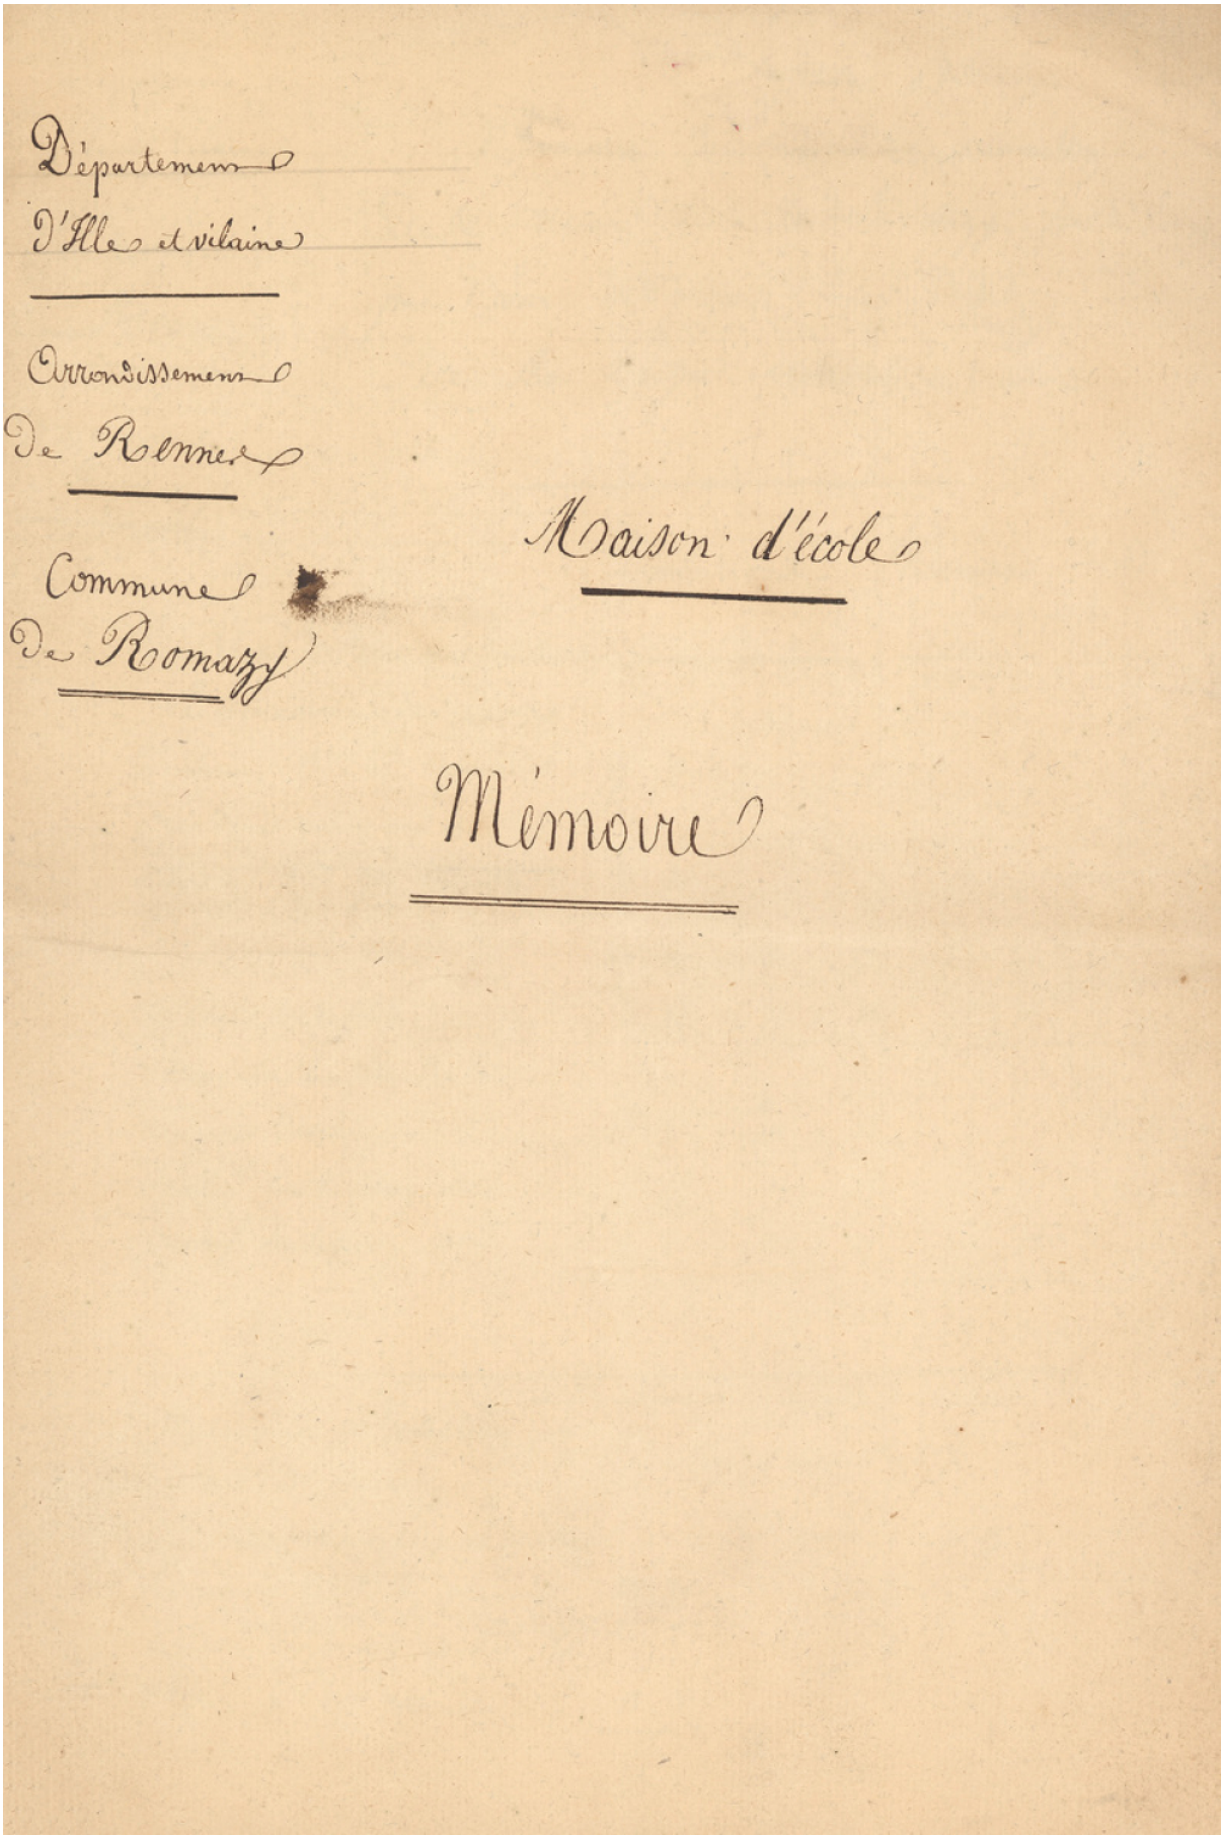
Département
d'Ille et vilaine

Arrondissement
de Rennes

Commune
de Romazy

Maison d'école

Mémoire

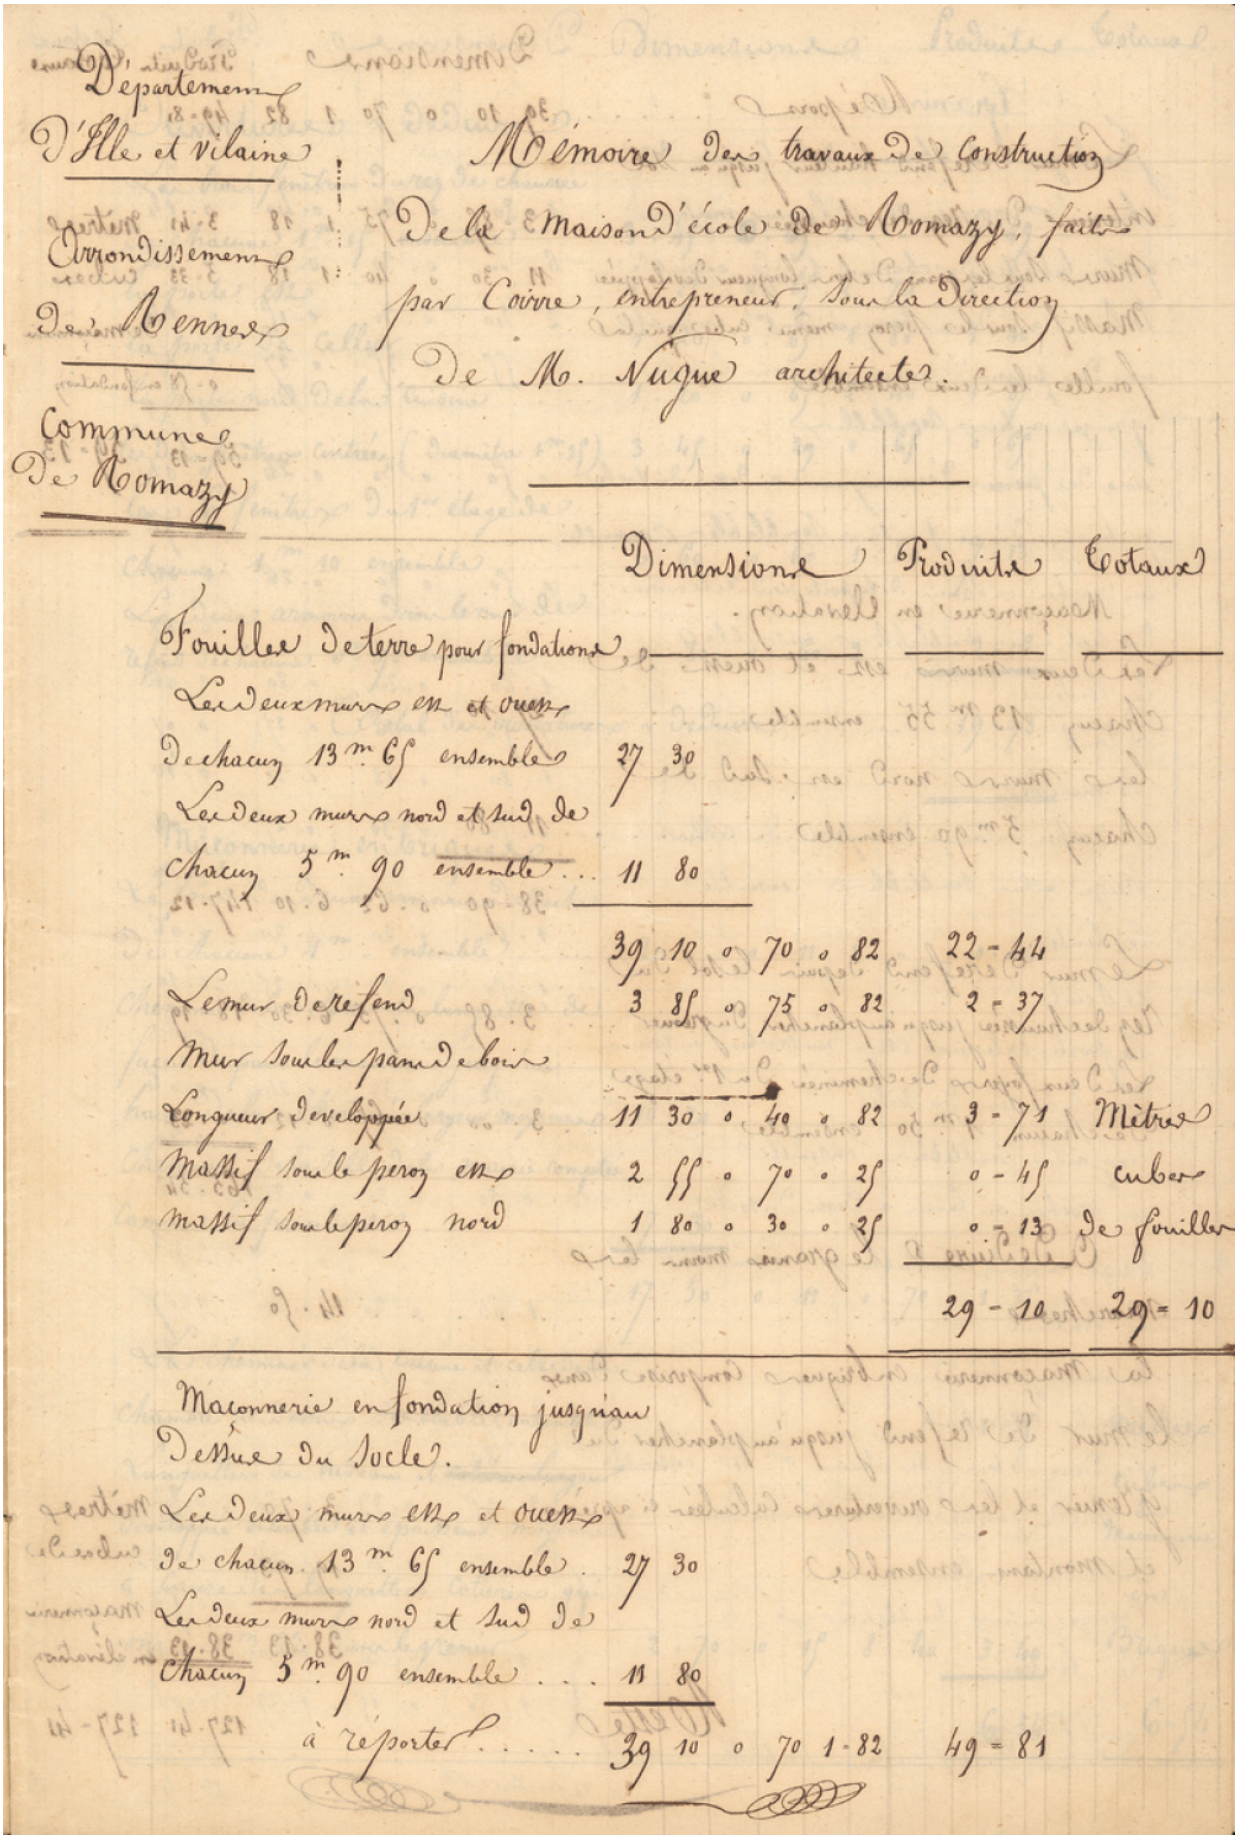

Departement
D'Ille et Vilaine

Arrondissement
De Rennes

Commune
De Romazy

Mémoire des travaux de Construction de la Maison d'école de Romazy, fait par Coivre, entrepreneur, sous la Direction de M. Nugue architecte.

	Dimensions			Produits	Totaux
Fouilles de terre pour fondations					
Les deux murs est et ouest de chacun 13 m. 65 ensemble	27	30			
Les deux murs nord et sud de chacun 5 m. 90 ensemble	11	80			
	39	10	0 70 0 82	22 - 44	
Le mur de refend	3	85	0 75 0 82	2 - 37	
Mur sous les pans de bois					
Longueur developpée	11	30	0 40 0 82	3 - 71	Mètres
Massif sous le perron est	2	55	0 70 0 25	0 - 45	cubes
massif sous le perron nord	1	80	0 30 0 25	0 - 13	de fouille
				29 - 10	29 - 10

Maçonnerie en fondation jusqu'au dessus du Socle.

Les deux murs est et ouest de chacun 13 m. 65 ensemble	27	30			
Les deux murs nord et sud de chacun 5 m. 90 ensemble	11	80			
à reporter	39	10	0 70	1 - 82	49 - 81

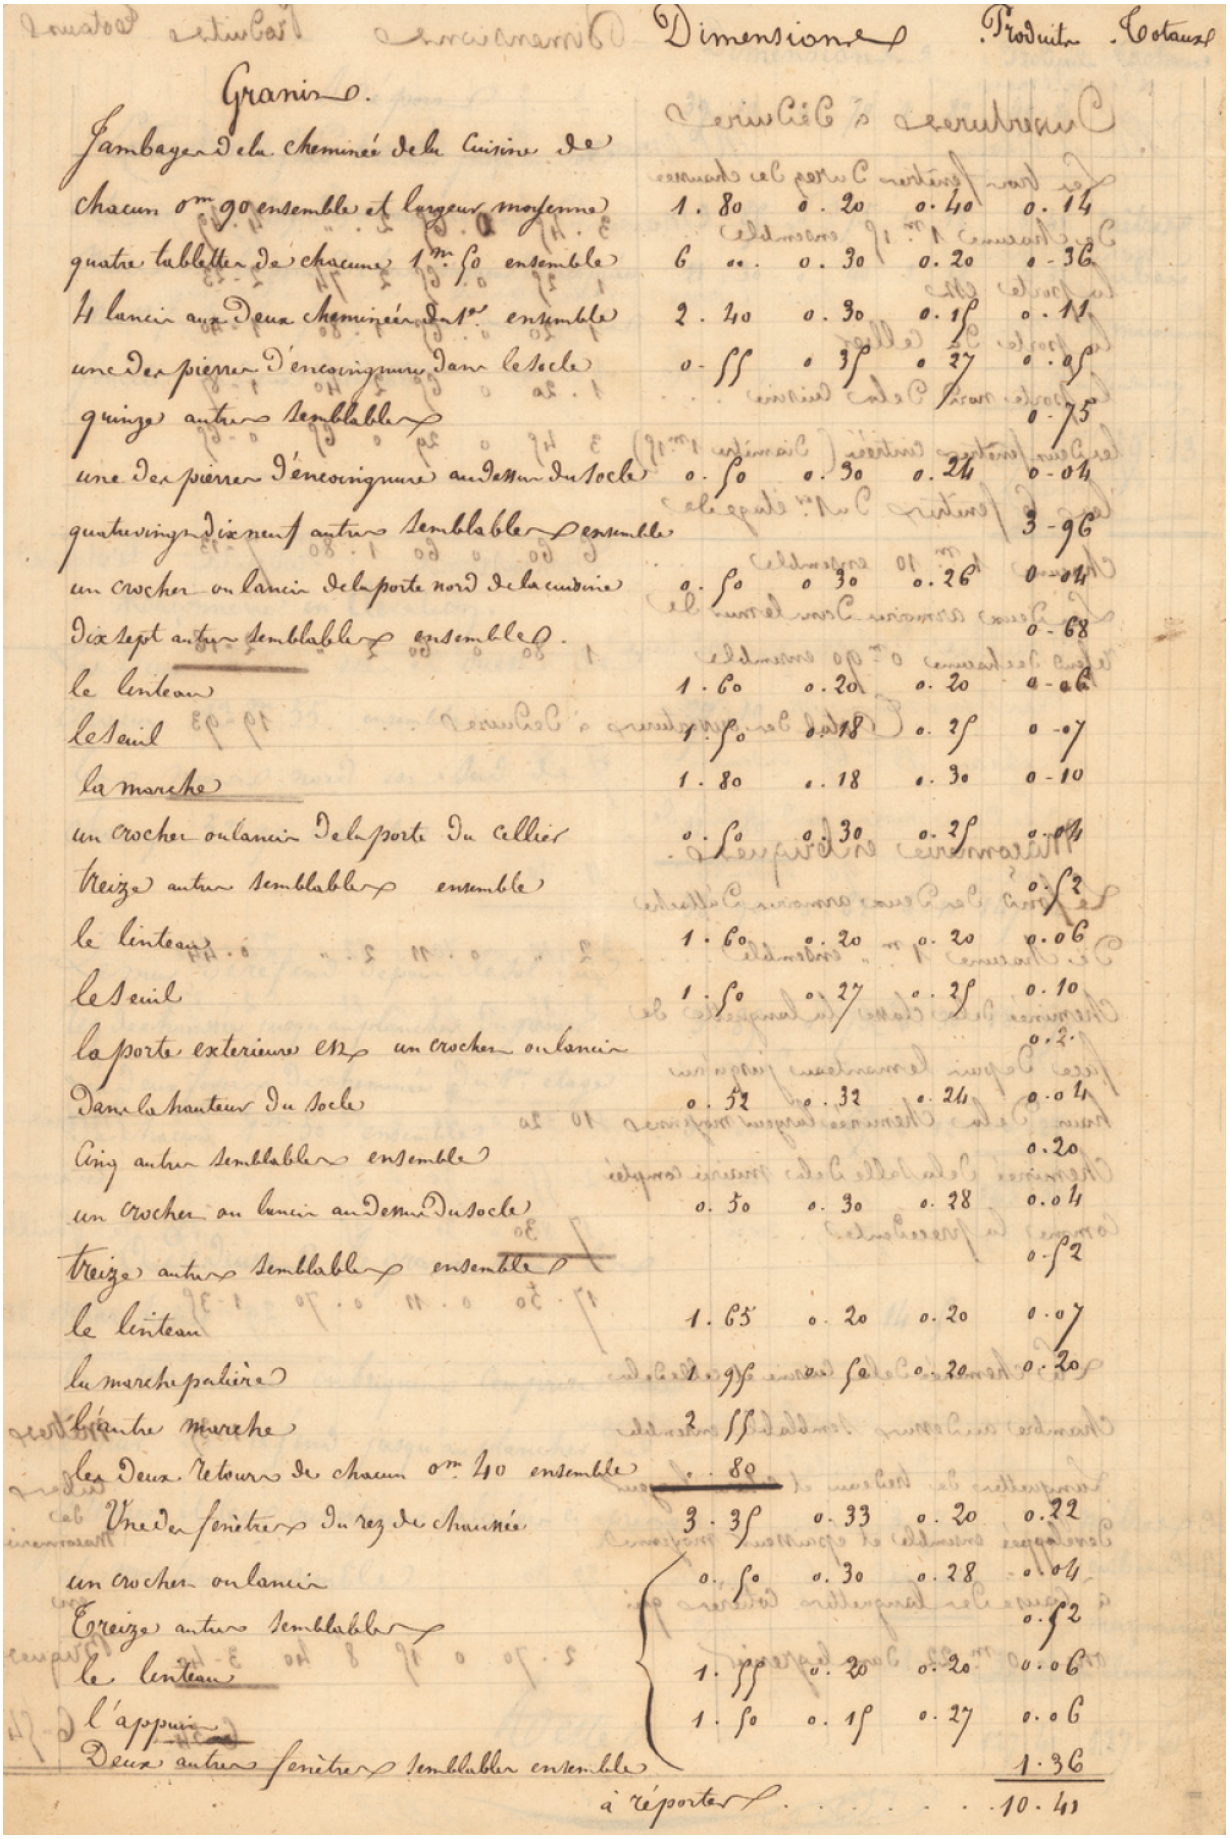

	Dimensions			Produits Totaux
Granit.				
Jambage de la cheminée de la cuisine de				
chacun 0m 90 ensemble et largeur moyenne	1. 80	0. 20	0. 40	0. 14
quatre tablettes de chacune 1m 50 ensemble	6 00	0. 30	0. 20	0 - 36
4 lancis aux Deux cheminées du 1er ensemble	2. 40	0. 30	0. 15	0. 11
une des pierres d'encoignure dans le socle	0. 55	0 35	0 27	0 . 05
quinze autres semblables				0 - 75
une des pierres d'encoignure au dessus du socle	0. 50	0. 30	0. 24	0 - 04
quatre vingts dix neuf autres semblables ensemble				3 - 96
un crochet ou lancis de la porte nord de la cuisine	0. 50	0 30	0. 26	0 - 04
Dix sept autres semblables ensemble.				0 - 68
le linteau	1. 60	0. 20	0. 20	0 - 06
le seuil	1. 50	0. 18	0. 35	0 - 07
la marche	1. 80	0. 18	0. 30	0 - 10
un crochet ou lancis de la porte du cellier	0. 50	0. 30	0. 25	0. 04
treize autres semblables ensemble				0. 52
le linteau	1. 60	0. 20	0. 20	0. 06
le seuil	1. 50	0. 27	0. 25	0. 10
la porte extérieure et un crochet ou lancis				0. 2.
dans la hauteur du socle	0. 32	0. 32	0. 24	0. 01
cinq autres semblables ensemble				0. 20
un crochet ou lancis au dessus du socle	0. 30	0. 30	0. 28	0. 01
treize autres semblables ensemble				0. 52
le linteau	1. 65	0. 20	0. 20	0. 07
la marche palière	1. 95	0. 50	0. 20	0. 20
la contre marche	2 55			
les Deux retours de chacun 0m 40 ensemble	0. 80			
Une des fenêtres du rez de chaussée	3. 35	0. 33	0. 20	0. 22
un crochet ou lancis	0. 50	0. 30	0. 28	0. 04
Treize autres semblables				0. 52
le linteau	1. 55	0. 20	0. 20	0. 06
l'appui	1. 50	0. 15	0. 27	0. 06
Deux autres fenêtres semblables ensemble				1. 36
à reporter				10. 41
